

Rekonstrukce silnice I/57



Investor: Ředitelství silnic a dálnic

Dodavatel: Eurovia CS, a. s.

Přípravné práce: 17. 6.–30. 6., 15. 7.–28. 7. 2024

Frézování a pokládka: 1. 7.–14. 7. 2024

Pokládka finální vrstvy: 29. 7.–3. 8. 2024

Vodorovné dopravní značení: 27. 8.–31. 8. 2024

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje rekonstrukci hlavního průtahu městem Valašské Klobouky.

Rekonstruovat se bude část silnice I/57 od křižovatky ulic Brumovská a Soukenická, přes ulici Čs. armády po ulici Cyrilometodějskou (výjezd z města). S ohledem na stavební práce bude v lokalitě částečná uzavírka a provoz budou řídit semaforey.

V době přípravných prací bude umožněn vjezd na všechny místní komunikace a k rodinným domům.

V době frézování a pokládky živičných vrstev (podkladní, ložné i obrusné) nebude umožněn vjezd k rodinným domům, průmyslovým objektům, obchodům a čerpacím stanicím, včetně uzavření místních komunikací, a to vždy pouze v dané etapě.

Aktuální podrobnosti od zhotovitele stavby, například o termínech, uzavřených úsecích i objízdných trasách, bude město Valašské Klobouky zveřejňovat na webových stránkách. Informační servis bude zajištěn i prostřednictvím Mobilního Rozhlasu (Municipolis), registrujte si prosím e-mail a stáhněte si aplikaci do chytrého telefonu.



QR kód
webové stránky
města
Valašské
Klobouky



QR kód
registrace
Mobilního
Rozhlasu



Předpokládaný harmonogram etap:

1. 7.–2. 7. + 29. 7. 2024

Etapa I: úsek od ul. 2. května (uzavřena) po ul. Školní (uzavřena), včetně uzavírek v úseku stavby

3. 7.–4. 7. + 30. 7. 2024

Etapa II: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Palackého (uzavřen výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby

5. 7.–6. 7. + 31. 7. 2024

Etapa III: od ul. Soukenická (výjezd umožněn) po ul. 2. května, uzavření křižovatky Dobrovského – směr Sychrov (provoz veden přes ul. 2. května)

8. 7.–9. 7. + 1. 8. 2024

Etapa IV: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Soukenická (výjezd umožněn), včetně uzavírek v úseku stavby

10. 7.–11. 7. + 2. 8. 2024

Etapa V: od vjezdu do města po ul. Školní (v provozu), včetně uzavírek v úseku stavby

12. 7.–13. 7. + 3. 8. 2024



Etapa VI: od vjezdu do města po ul. Palackého (v provozu vjezd a výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby

4. 8.–26. 8. 2024





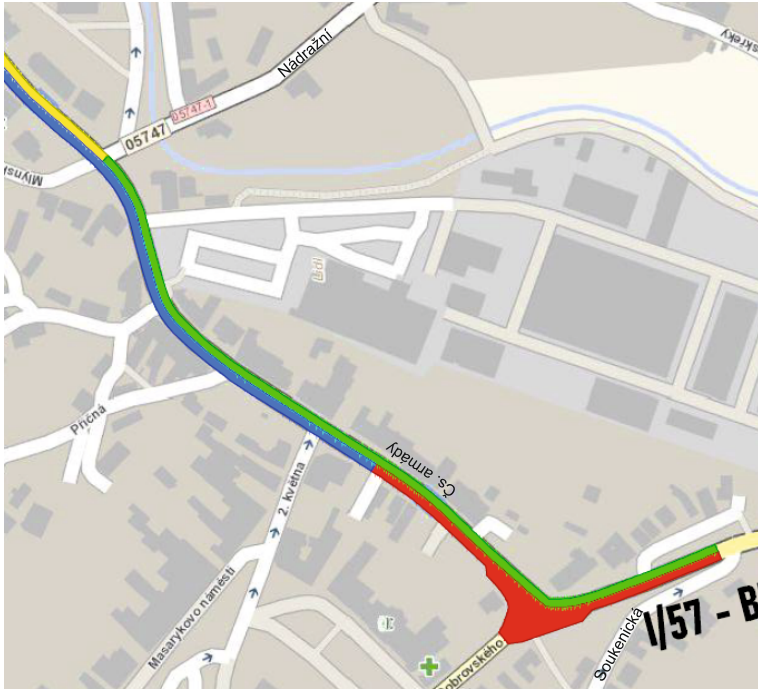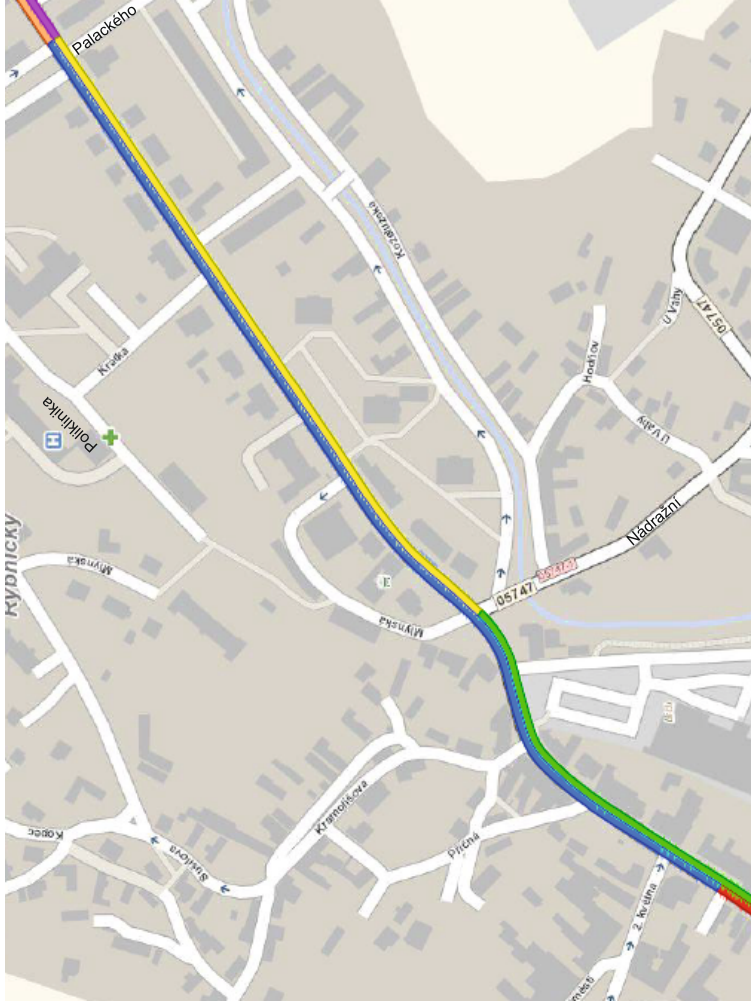

Dokončovací práce: průjezd stavbou bez většího omezení

27. 8.–31. 8. 2024

Vodorovné dopravní značení



LEGENDA:

	Etapa I: 1. 7.–2. 7. + 29. 7. 2024
	Etapa II: 3. 7.–4. 7. + 30. 7. 2024
	Etapa III: 5. 7.–7. 7. + 31. 7. 2024
	Etapa IV: 8. 7.–9. 7. + 1. 8. 2024
	Etapa V: 10. 7. – 11. 7. + 2. 8. 2024
	Etapa VI: 12. 7. – 14. 7. + 3. 8. 2024
